



REGIONE SICILIA

CITTA' DI SORTINO

PROVINCIA DI SIRACUSA


Viale M. Giardino s.n.c. - 96010

## LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'AREA ATTENDAMENTI E CONTAINERS IN C.DA PIANO LARDO

PROGETTO ESECUTIVO  
D.P.R. 207/2010



**PROTEZIONE CIVILE**  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile

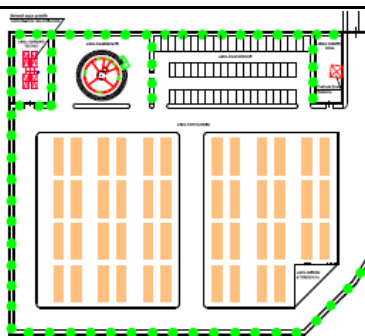

Progettisti:	Geom. Fabio Barbargallo Geom. Antonio Privitera Geom. Massimo Caruso
Coord. Sicurezza in fase di progettazione:	Arch. Gaetano Gulino
Responsabile Unico del rocedimento:	Arch. Luigi Raffa
Responsabile del Settore Urbanistica:	Arch. Luigi Raffa
Tavola:  <b>G/e</b>	Titolo: <b>PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Tipologia dei Cartelli</b>
Data:  DICEMBRE 2015	Scala:
Aggiornamenti-Annotazioni: AGGIORNAMENTO VALIDAZIONE PROGETTO	

## LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

### CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera:	<b>Opere edili e urbanizzazione</b>
OGGETTO:	Sistemazione area per attendamenti e containers in c.da LAGO
Importo presunto dei Lavori:	1.430.408,81euro
Numero imprese in cantiere:	<b>4 (previsto)</b>
Numero massimo di lavoratori:	<b>12 (massimo presunto)</b>
Entità presunta del lavoro:	<b>450 uomini/giorno</b>
Data inizio lavori:	
Data fine lavori (presunta):	
Durata in mesi (presunta):	<b>18</b>

### ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

#### Si richiede la seguente Cartellonistica

All'ingresso del cantiere:

- cartello indicante anagrafica dei lavori
- cartello indicante il divieto di ingresso ai non addetti ai lavori
- cartello con divieto di avvicinarsi ai mezzi d'opera
- cartello indicante l'uso dei dispositivi di protezione (casco, tute ecc.)

Sull'accesso carraio:

- cartello di pericolo generico con l'indicazione di procedere adagio
- cartello dei carichi sospesi (da posizionarsi inoltre in vicinanza della gru, dei montacarichi ecc.)

Dove esiste uno specifico rischio:

- cartello di divieto di fumare ed usare fiamme libere in tutti i luoghi in cui può esservi pericolo di incendio ed esplosione
- cartello di divieto di rimozione delle protezioni delle macchine e utensili

Dove è possibile accedere agli impianti elettrici:

- cartello indicante la tensione in esercizio
- cartello indicante la presenza di cavi elettrici
- cartello indicante la presenza di cavi elettrici aerei

Presso gli apparecchi di sollevamento:

- cartello indicante la portata massima dell'apparecchio
- cartello indicante le norme di sicurezza per gli imbragatori
- cartello indicante il codice di segnalazione per la manovra della gru


Presso i ponteggi:








- cartello indicante ponteggio in allestimento
- cartello indicante il pericolo di caduta dall'alto
- cartello indicante il divieto di gettare materiali dai ponteggi
- cartello indicante il divieto di salire o scendere dai ponteggi senza l'utilizzo delle apposite scale
- cartello indicante il divieto di utilizzo di scale in cattivo stato di conservazione
- luci rosse e con dispositivi rifrangenti aventi superficie minima di 50 mq





Presso scavi:

- cartello di divieto di accedere o sostare vicino agli scavi
- cartello di divieto di depositare materiali sui cigli

## SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE

	<p>Cartello di avvertimento generico          Cartello orario di lavoro          Cartello descrizione cantiere</p>
	<p>Allestimento ponteggio</p>
	<p>Messa a terra</p>

	Tensione elettrica
	Cadute con dislivello
 SCAVI PERICOLOSO AVVICINARSI	Pericolo di caduta in scavo
 3216	Veicoli a passo d'uopo
	Passaggio obbligatorio per i pedoni
	Vietato ai pedoni
	Non arrampicarsi sui ponteggi

	<p>Vietato passare presenza escavatore</p>
	<p>Lavori in corso</p>
	<p>Barriera direzionale</p>
	<p>Primo soccorso</p>
