



Comune di Torregrotta

Provincia di Messina



Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e dei servizi annessi alla Via Pier Santi Mattarella della frazione Scala del Comune di Torregrotta (ME).

Progetto Definitivo - Esecutivo














Visti e approvazioni:

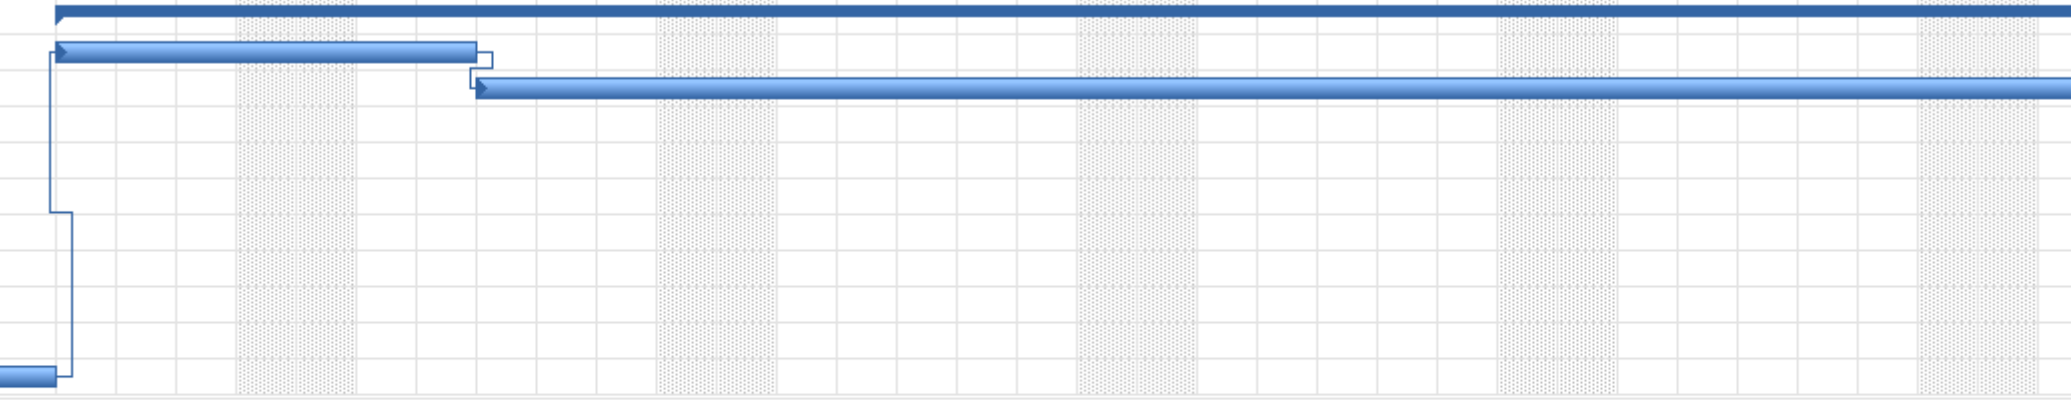
Il Progettista
ing. Francesco Coiro

Il R.U.P.
ing. Pietro Anastasi

Elaborato:
A.10 - Cronoprogramma dei lavori

Rev. 00 - Febbraio 2019

| Attività | Durata | Data inizio | Data fine | 1/9 | | | | | | | 8/9 | | | | | | | | |
|---|--------|--------------------|--------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----------|-----|
| | | | | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun |
|  1 - OPERE DI DEMOLIZIONE | 25,00 | 18 SET 19 00:00:00 | 23 OTT 19 00:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  1.1 - Alberi e ceppaie | 5,00 | 18 SET 19 00:00:00 | 25 SET 19 00:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  1.2 - Marciapiede ed altri | 20,00 | 25 SET 19 00:00:00 | 23 OTT 19 00:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  2 - OPERE STRADALI | 23,00 | 15 NOV 19 12:00:00 | 18 DIC 19 12:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  3 - IMPIANTI | 17,50 | 23 OTT 19 00:00:00 | 15 NOV 19 12:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  3.1 - Illuminazione | 2,50 | 5 NOV 19 00:00:00 | 7 NOV 19 12:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  3.2 - Acquedotto | 7,00 | 25 OTT 19 00:00:00 | 5 NOV 19 00:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  3.3 - Raccolta acque piovane | 2,00 | 23 OTT 19 00:00:00 | 25 OTT 19 00:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  3.4 - Vari da mantenere ed adeguare | 6,00 | 7 NOV 19 12:00:00 | 15 NOV 19 12:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  4 - OPERE A VERDE ED ARREDO URBANO | 4,00 | 18 DIC 19 12:00:00 | 27 DIC 19 12:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  5 - OPERE PROVVISORIALI E SICUREZZA | 12,00 | 2 SET 19 00:00:00 | 18 SET 19 00:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Inizio Lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Fine Lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Durata Lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale Preventivo | | | | 0,00 | | | | | | | 11.446,35 | | | | | | | 11.446,35 | |
| Totale Preventivo Progressivo | | | | 0,00 | | | | | | | 11.446,35 | | | | | | | 22.892,68 | |
| Percentuale Preventivo | | | | 0,00 | | | | | | | 4,20 | | | | | | 4,20 | | |
| Percentuale Preventivo Progressivo | | | | 0,00 | | | | | | | 4,20 | | | | | | 8,42 | | |

| 15/9 | | | | | 22/9 | | | | | | | 29/9 | | | | | | | 6/10 | | | | | | | 13/10 | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 10.694,94 | | | | | | | 9.876,70 | | | | | | | 9.665,17 | | | | | | | 9.665,17 | | | | | | | | |
| | | | | | 33.587,62 | | | | | | | 43.464,33 | | | | | | | 53.129,50 | | | | | | | 62.794,66 | | | | | | | 72.459,83 | |
| | | | | | 3,93 | | | | | | | 3,62 | | | | | | | 3,56 | | | | | | | 3,56 | | | | | | | 3,56 | |
| | | | | | 12,35 | | | | | | | 15,99 | | | | | | | 19,55 | | | | | | | 23,10 | | | | | | | 26,66 | |

[illegible]
